

Date de l'intervention :

KT 42 – 60 – 90 - 130

Client	Installateur
Nom :	Entreprise :
Adresse :	Nom du technicien :
Tel :	Tel :
Mail :	Mail :

Caractéristiques de l'appareil
Modèle :
N° de série :
Date de mise en service :
Date du dernier entretien :

Repérer par un cercle la position de l'appareil contrôlé


BÂTIMENT	Magasin
-----------------	----------------

En plus des indications données, il est important d'exercer son bon sens et de respecter les principes élémentaires de sécurité.

Points à contrôler	Validé	Non validé
Mettre hors tension l'appareil / Cadenasser le disjoncteur		
01 Ouvrir l'appareil (60-90-130) en retirant les vis extérieures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Soufflette + eau (pas d'eau sur le ventilateur)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Contrôler l'équilibrage du ventilateur en le faisant tourner à la main	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Nettoyer la grille du ventilateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05 Démonter le brûleur et le souffler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Nettoyer la grille d'entrée d'air	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07 Souffler le coffret électrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 Resserrer les bornes électriques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pièces à changer		Fréquence	Remplacé	Non remplacé
50	Sonde ionisation (droite)	1 an	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	Sonde d'allumage électronique (écartement du brûleur : 4 mm)	1 an	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	Thermostat de surchauffe (Réarmer au besoin)	1 an	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	Injecteur (gicleur)	2 ans	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mettre sous tension l'appareil		Validé	Non validé
100	Contrôler l'état général de l'appareil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101	Contrôler la couleur de la flamme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
102	Faire fonctionner l'appareil 5 min : absence de bruit anormal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

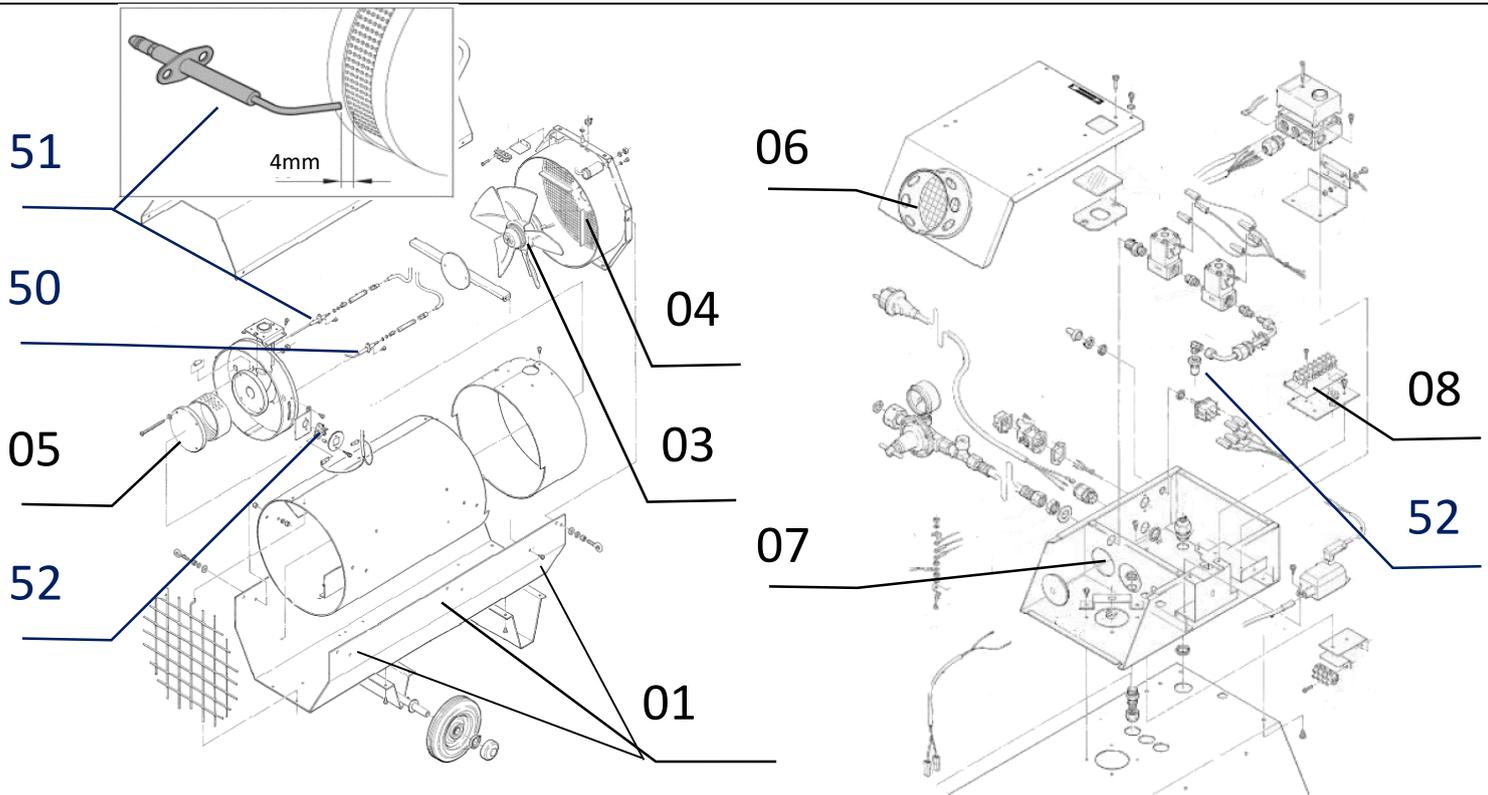

Observations

Signature du client

Signature de l'installateur

Cette maintenance préventive a pour but d'éviter certaines pannes récurrentes.
